




Presentazione RTB

Gruppo n° 8 - A.A. 2024/2025



ALimitedGroup

21/02/2025



Aggiornamento comprensione obiettivi del capitolato (1/2)

- Analisi dei Requisiti: abbiamo trovato molti requisiti impliciti;

Tipologia	Obbligatoria	Desiderabili	Opzionali
Funzionali	170	22	0
Qualità	9	1	0
Vincolo	5	0	0

- Alcuni requisiti ora sono facoltativi (e.g. notifiche *machine learning*).

Aggiornamento comprensione obiettivi del capitolato (2/2)

- Forte rischio tecnologico: poca esperienza del gruppo nelle tecnologie scelte;




- Sfida interessante: sincronizzare i compiti tra microservizi dello stesso tipo.

Modifiche migliorative (1/3)

- Ristrutturate Norme di Progetto;
- Ristrutturata Analisi dei Requisiti, divisa tra *frontend* e *backend*;
- Aggiunta di una versione del Glossario fruibile direttamente tramite *browser*.

Modifiche migliorative (2/3)

- Ristrutturato sito.

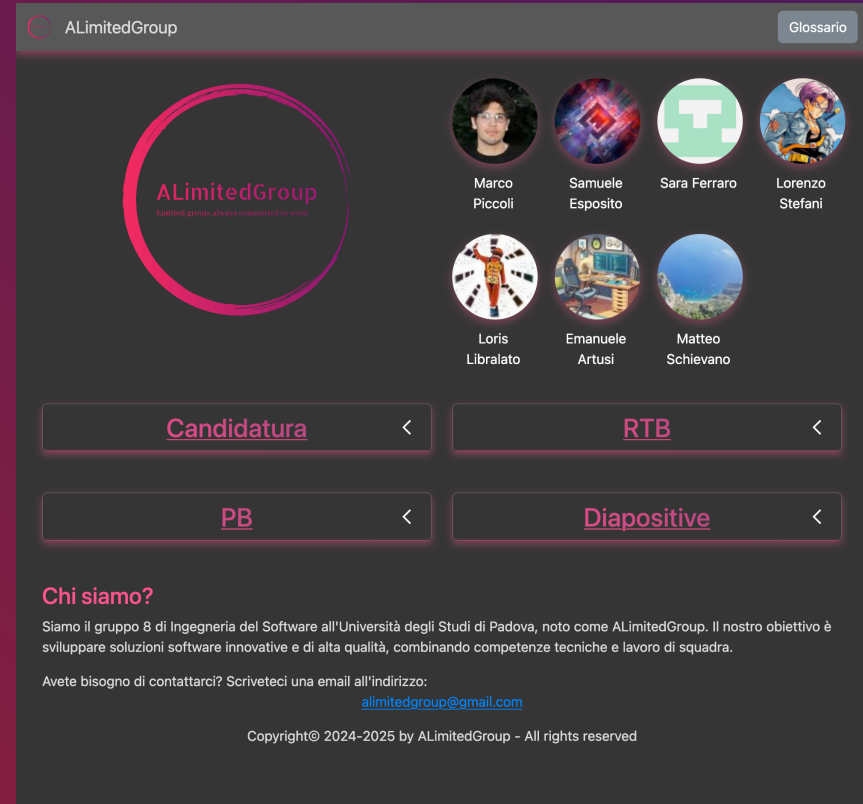

Modifiche migliorative (3/3)

- Organizzazione più specifica;
- *Pull request* più brevi.

Autovalutazione del lavoro svolto

- Generalmente, il gruppo è soddisfatto;
- Ognuno ha contribuito al raggiungimento della *Requirements and Technology Baseline*;
- Abbiamo avuto poche riunioni con **M31**.

Esito della riunione con il Prof. Cardin

- Dopo un'iniziale fase di disaccordo, le nostre scelte sono state ritenute ponderate e giustificate;
- Sono stati segnalati alcuni piccoli errori sul documento di Analisi dei Requisiti, che abbiamo già iniziato a correggere;
- Abbiamo ricevuto il **semaforo verde**.

Consuntivo di periodo allo stato attuale

	RESP.		AMM.		ANALIS.		PROGET.		PROGR.		VERIF.		TOTALE	
	EFF.	DIFF. P.	EFF.	DIFF. P.	EFF.	DIFF. P.	EFF.	DIFF. P.	EFF.	DIFF. P.	EFF.	DIFF. P.	EFF.	DIFF. P.
<i>Loris Libralato</i>	8		6	-1	8	1			15	-3	2		39	-3
<i>Samuele Esposito</i>	5		4						16	-1	3		28	-1
<i>Sara Ferraro</i>			14		9						11	1	34	1
<i>Lorenzo Stefani</i>			5		4						9		18	0
<i>Marco Piccoli</i>	4		7	3	21	-1				1	5		37	3
<i>Matteo Schievano</i>	1	-1	12	4	24	3					13	2	50	8
<i>Emanuele Artusi</i>			12	2	10						11	4	33	6
TOTALE	18	-1	60	8	76	3	0	0	31	-3	54	7	239	14
COSTO	€540	-€30	€1,200	€160	€1,900	€75	€0	€0	€465	-€45	€810	€105	€4,915	€265

Preventivo a finire

	RESP.	AMM.	ANALIS.	PROGET.	PROGR.	VERIF.	TOTALE
<i>Loris Libralato</i>		3		22	14	14	53
<i>Samuele Esposito</i>	6	5	5	22	11	15	64
<i>Sara Ferraro</i>	7		1	20	24	6	58
<i>Lorenzo Stefani</i>	8	3	1	21	27	14	74
<i>Marco Piccoli</i>	2	1		12	25	15	55
<i>Matteo Schievano</i>	2			14	20	6	42
<i>Emanuele Artusi</i>	7			21	23	8	59
TOTALE	32	12	7	132	144	78	405
COSTO	€960	€240	€175	€3,300	€2,160	€1,170	€8,005
